

المقاول		وكالة التعمير و المشاريع		الاستشاري	
شركة طرق الرياض للمقاولات		الإدارة العامة للتنفيذ و الإشراف		مكتب رمل للإستشارات الهندسية	
		إدارة تنفيذ الطرق			
☒	تقديم جديد	مشروع تلال الغروب			
☐	إعادة تقديم	استمارة طلب تسليم رقم		الإعمال المساحية و الترابية	

اسم الحي : الامير فواز		رقم المخطط : BLOCK11		رقم الشارع : PED 02		عرض الشارع : 10	
استلام الطبقة : BOTTOM SUBGRADE2		00+0		الى محطة رقم : 100+0			

توقيع مهندس الموقع :		التاريخ : 18/8/2024		اعمال اخرى :	
☐	المراقب	☐	المساح	☐	المختبر
توقيع المهندس المشرف :					

ملاحظات :		ملاحظات :	
ملاحظات :		ملاحظات :	

نتيجة تدقيق المساحة :		من المحطة : 100+0		الى المحطة : 100+0	
مرفقات :		من المحطة :		الى المحطة :	
☐	القطاع الطولي	☐	القطاع العرضي	☐	اخرى
متطابق		متطابق		غير متطابق	
ملاحظات :		ملاحظات :		ملاحظات :	

نتيجة تدقيق المواد :		من محطة :		الى محطة :	
تصنيف المواد		قيمة البركتور		الرطوبة المثلي :	
☐	مرفق	مرفق		مرفق	
☐	غير مرفق	غير مرفق		غير مرفق	

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	الى محطة					

النتيجة :		راسب		التاريخ : / /	
ملاحظات :		ملاحظات :		ملاحظات :	

ملاحظات : إرشادات نتائج الاختبارات للمدرك		ملاحظات :	
تعليمات المهندس الاستشاري :		ملاحظات :	
☒	موافق	☐	غير موافق
التوقيع :		التوقيع :	
التاريخ : / /		التاريخ : / /	

الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية		الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف		شركة طرق الرياض للمقاولات	
تقرير إستلام طبقة ردم					
PED-B11-02		رقم الشارع :-		تلال الغروب	
214.6		طول الشارع :-		BLOCK11	
10.00		عرض الشارع :-		BOUTTOM OF SUPGRADE	
		WIDHT-R 5.000		BOTTOM SGL	
		WIDHT-L 5.000		DEPTH FROM TOP SUB.G	
PVI	Station	Easting	Northing	R	
				C.L	CL width from L
		-5.000	-3.400	0.000	5.000
		2.00%	-2.00%	0.00%	2.00%
		52.612	52.580	52.600	52.580
		52.418	52.386	52.406	52.386
		52.225	52.193	52.213	52.193
		52.035	52.003	52.023	52.003
		51.853	51.821	51.841	51.821
		51.680	51.648	51.668	51.648
		51.515	51.483	51.503	51.483
		51.359	51.327	51.347	51.327
		51.210	51.178	51.198	51.178
		SLOPE		CL width from R	
1	0+000.00	528720.48±	2370247.254		
2	0+012.50	528732.01±	2370242.426		
3	0+025.00	528743.54±	2370237.597		
4	0+037.50	528755.07±	2370232.769		
4	0+050.00	528766.60±	2370227.940		
5	0+062.50	528778.13±	2370223.112		
7	0+075.00	528789.66±	2370218.283		
6	0+087.50	528801.19±	2370213.455		
7	0+100.00	528812.72±	2370208.626		
الإستشاري				المقاول	
مكتب رمك للإستشارات الهندسية				شركة طرق الرياض للمقاولات	
مختبر				الإسم :-	
مختبر				التوقيع :-	
مختبر				التاريخ :-	
18-8-2024					

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-240463.42
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Testing Date	18/08/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	Sample By	Saddam
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Bottom Sub Grade
Location	Block 11 Gardens Area No. 2 STA 0+000 to STA 0+100

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m ³	kg/m ³	%	%	%
1	0+010	2.332	2.204	5.8	100.6	
2	0+035	2.240	2.109	6.2	96.3	
3	0+065	2.297	2.167	6.0	98.9	
4	0+095	2.279	2.170	5.0	99.1	

M.D.D = 2.191 kg/m ³
O.M.C = 7.52 %


The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.


* These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.

Checked by
[Signature]



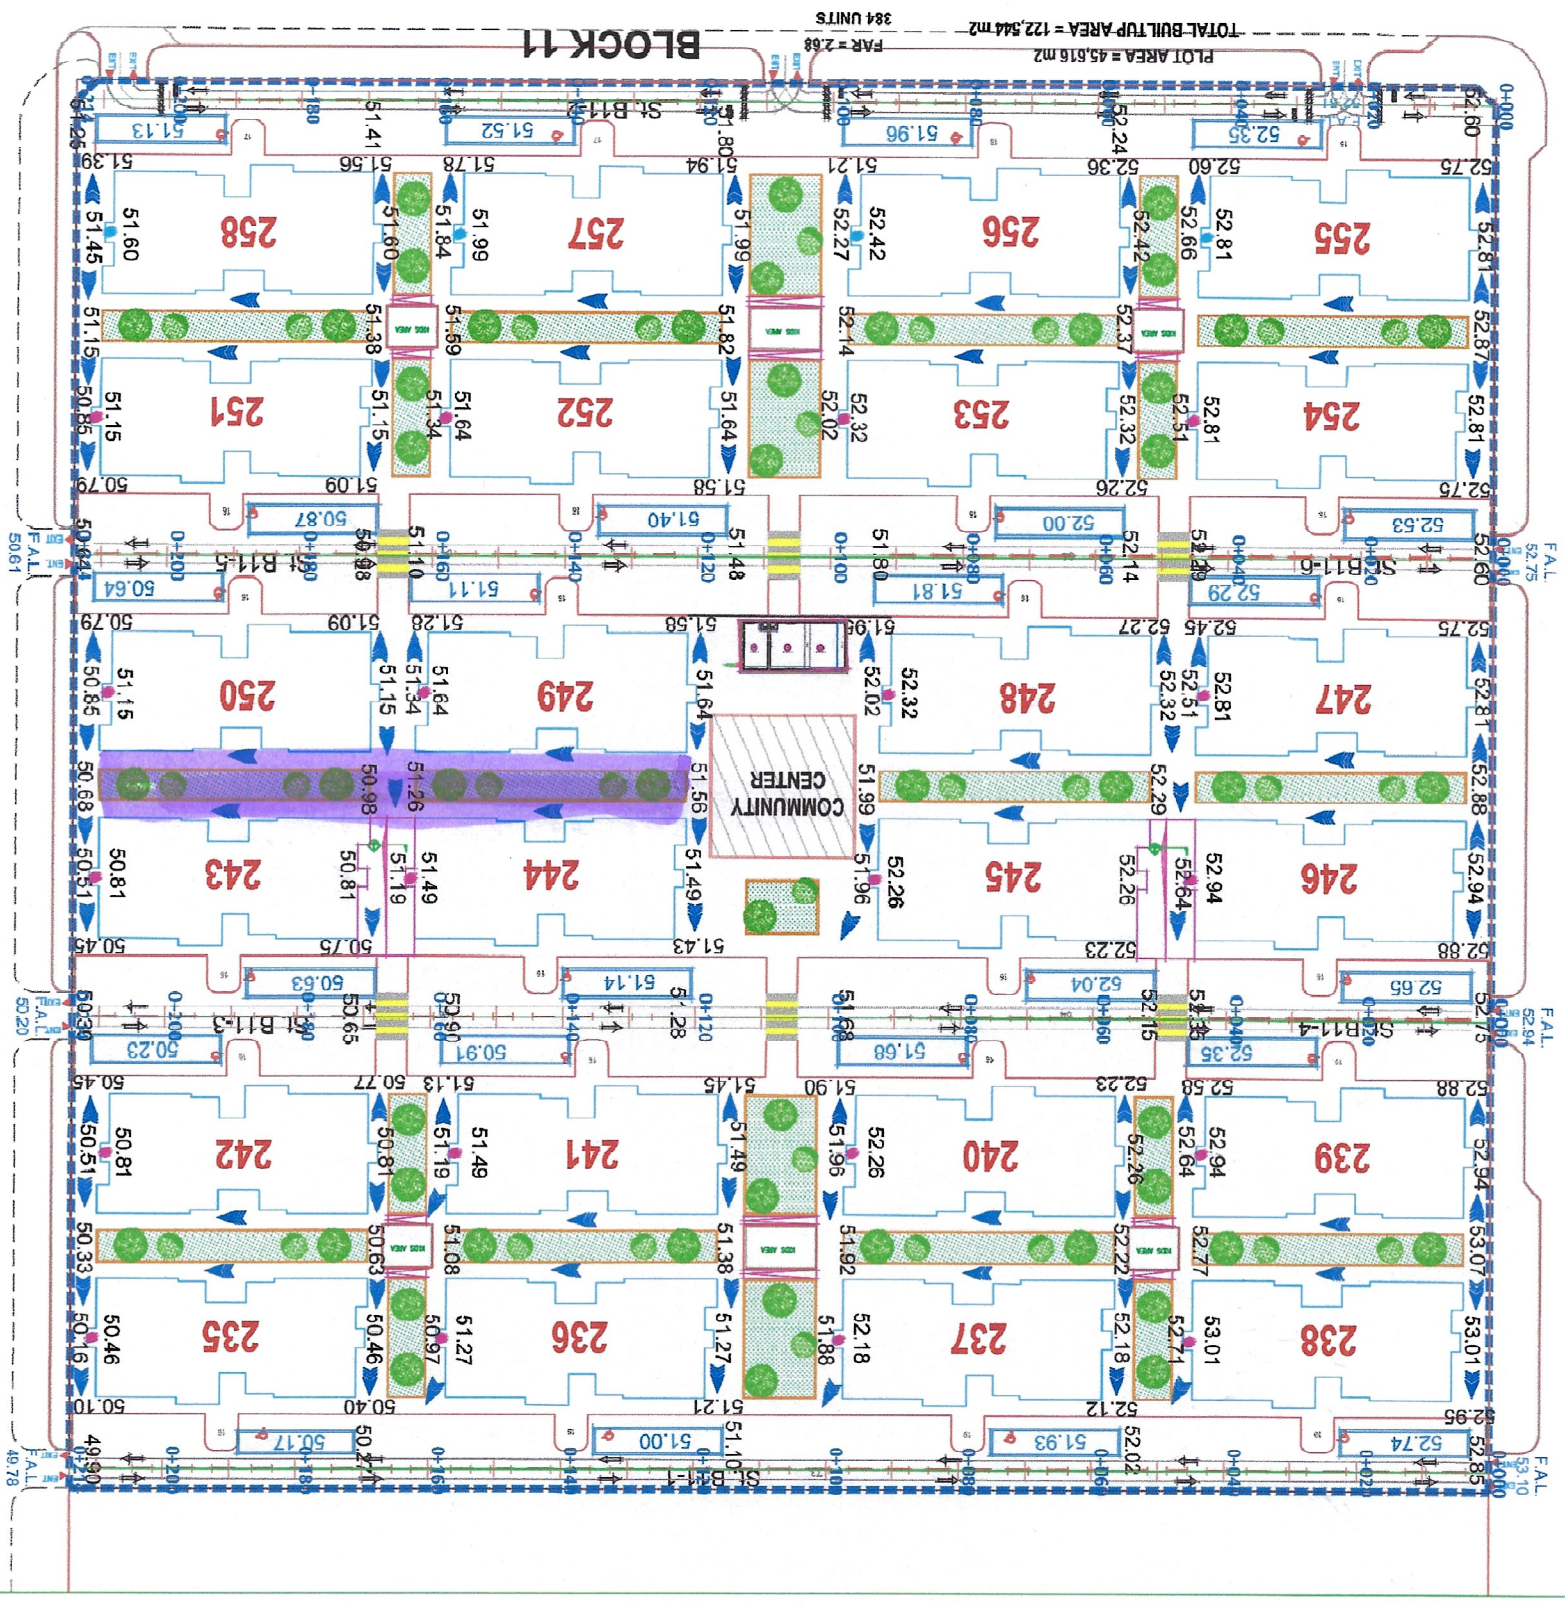

PLANT AREA = 45,616 m²
TOTAL BUILDUP AREA = 122,544 m²
FAR = 2.68
384 UNITS
